
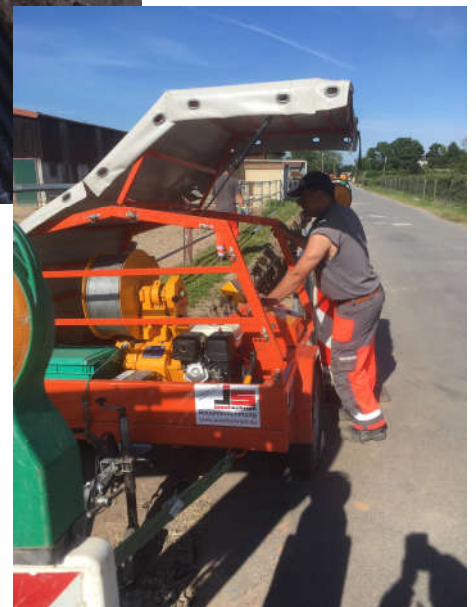


Bauvorhaben : Großsachsen Kabeltrasse

Zwischenbericht: Stand 20.11.2020

Auftrag der Stadtwerke Viernheim besteht darin eine Stromtrasse plus Mitverlegung Glasfaserkabel durch den Ortsteil Großsachsen in Hirschberg an der Bergstraße zu verlegen. Gesamtlänge ca. 3,5km

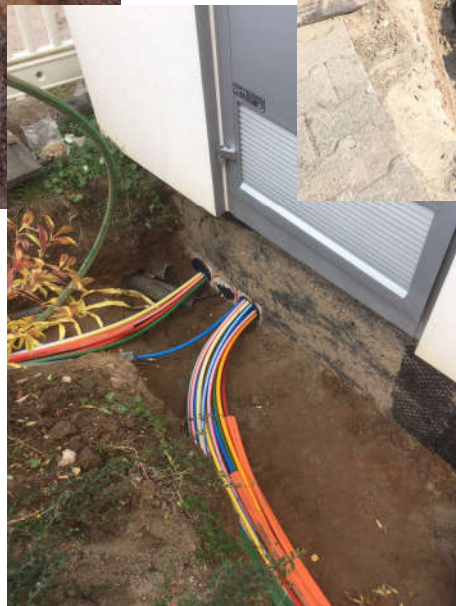

Bereits verlegt oder per Winde eingezogen wurden:

- 1307m Mittelspannungskabel
- 2980m Niederspannungskabel
- 1725m Steuerkabel
- 193m Straßenbeleuchtung
- 2340m Leerrohr PE-HD DN50
- 1935m Backbone 3x20 grau
- 2209m Versorgungsleitung (Backhaul) 4x20 (grün, orange, rot)
- 1795m Multileerrohr 12x10 (grün, orange , rot) für Hausanschlüsse

Ausführung der Arbeiten mittels:

1. Spülbohrung
2. offene Bauweise und
3. Durchpressung (wegen Bahnverkehr)
